

| Id. | | Tryb zadania | Nazwa zadania | Czas trwania | Uwagi | Rozpoczęcie | Zakończenie | Popr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--|
| | | | | | | | | | n | 02.sie.21 | p | w | ś | c | p | s | n | 09.sie.21 | p | w | ś | c | p | s | n | 16.sie.21 | p | w | ś | c | p | s | n | 23.sie | p | |
| 1 | | | Roboty rozbiórkowe | 28 dn | Liczba pracowników | pon, 02.08.21 | śro, 08.09.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Rozebranie fundamentów | 0,3 dn | 5 | pon, 02.08.21 | pon, 02.08.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Demontaż kiosku multimedialnego | 0,5 dn | 5 | pon, 02.08.21 | pon, 02.08.21 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Demontaz koryta betonowego | 0,8 dn | 5 | pon, 02.08.21 | wto, 03.08.21 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów | 3,1 dn | 5 | wto, 03.08.21 | pią, 06.08.21 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego | 0,4 dn | 5 | pią, 06.08.21 | pon, 09.08.21 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 20km | 0,4 dn | 5 | pon, 09.08.21 | pon, 09.08.21 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska | 0,1 dn | 1 | pon, 09.08.21 | pon, 09.08.21 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - ładunek kategorii II | 0,4 dn | 1 | pon, 09.08.21 | pon, 09.08.21 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II | 0,8 dn | 1 | wto, 10.08.21 | wto, 10.08.21 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska | 0,1 dn | 1 | wto, 10.08.21 | wto, 10.08.21 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Demontaż wpustów drogowych | 0,4 dn | 5 | pon, 09.08.21 | pon, 09.08.21 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Demontaż wpustów kablowych | 0,1 dn | 5 | pon, 09.08.21 | pon, 09.08.21 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Demontaż przewodów | 0,3 dn | 5 | pon, 09.08.21 | pon, 09.08.21 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Rozebranie mechaniczne nawierzchni | 4,8 dn | 10 | pon, 09.08.21 | pon, 16.08.21 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej | 8,1 dn | 10 | pon, 16.08.21 | czw, 26.08.21 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego | 3,1 dn | 10 | czw, 26.08.21 | wto, 31.08.21 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej | 0,7 dn | 10 | wto, 31.08.21 | śro, 01.09.21 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 1 dzień | 10 | śro, 01.09.21 | czw, 02.09.21 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - ładunek kategorii II | 1,4 dn | 5 | czw, 02.09.21 | pią, 03.09.21 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II | 2,9 dn | 5 | pon, 06.09.21 | śro, 08.09.21 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: Simple Project Plan
Data: pię, 13.08.21

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny


Postęp

Ręczne (postęp)


Strona 1

[illegible]

[illegible]

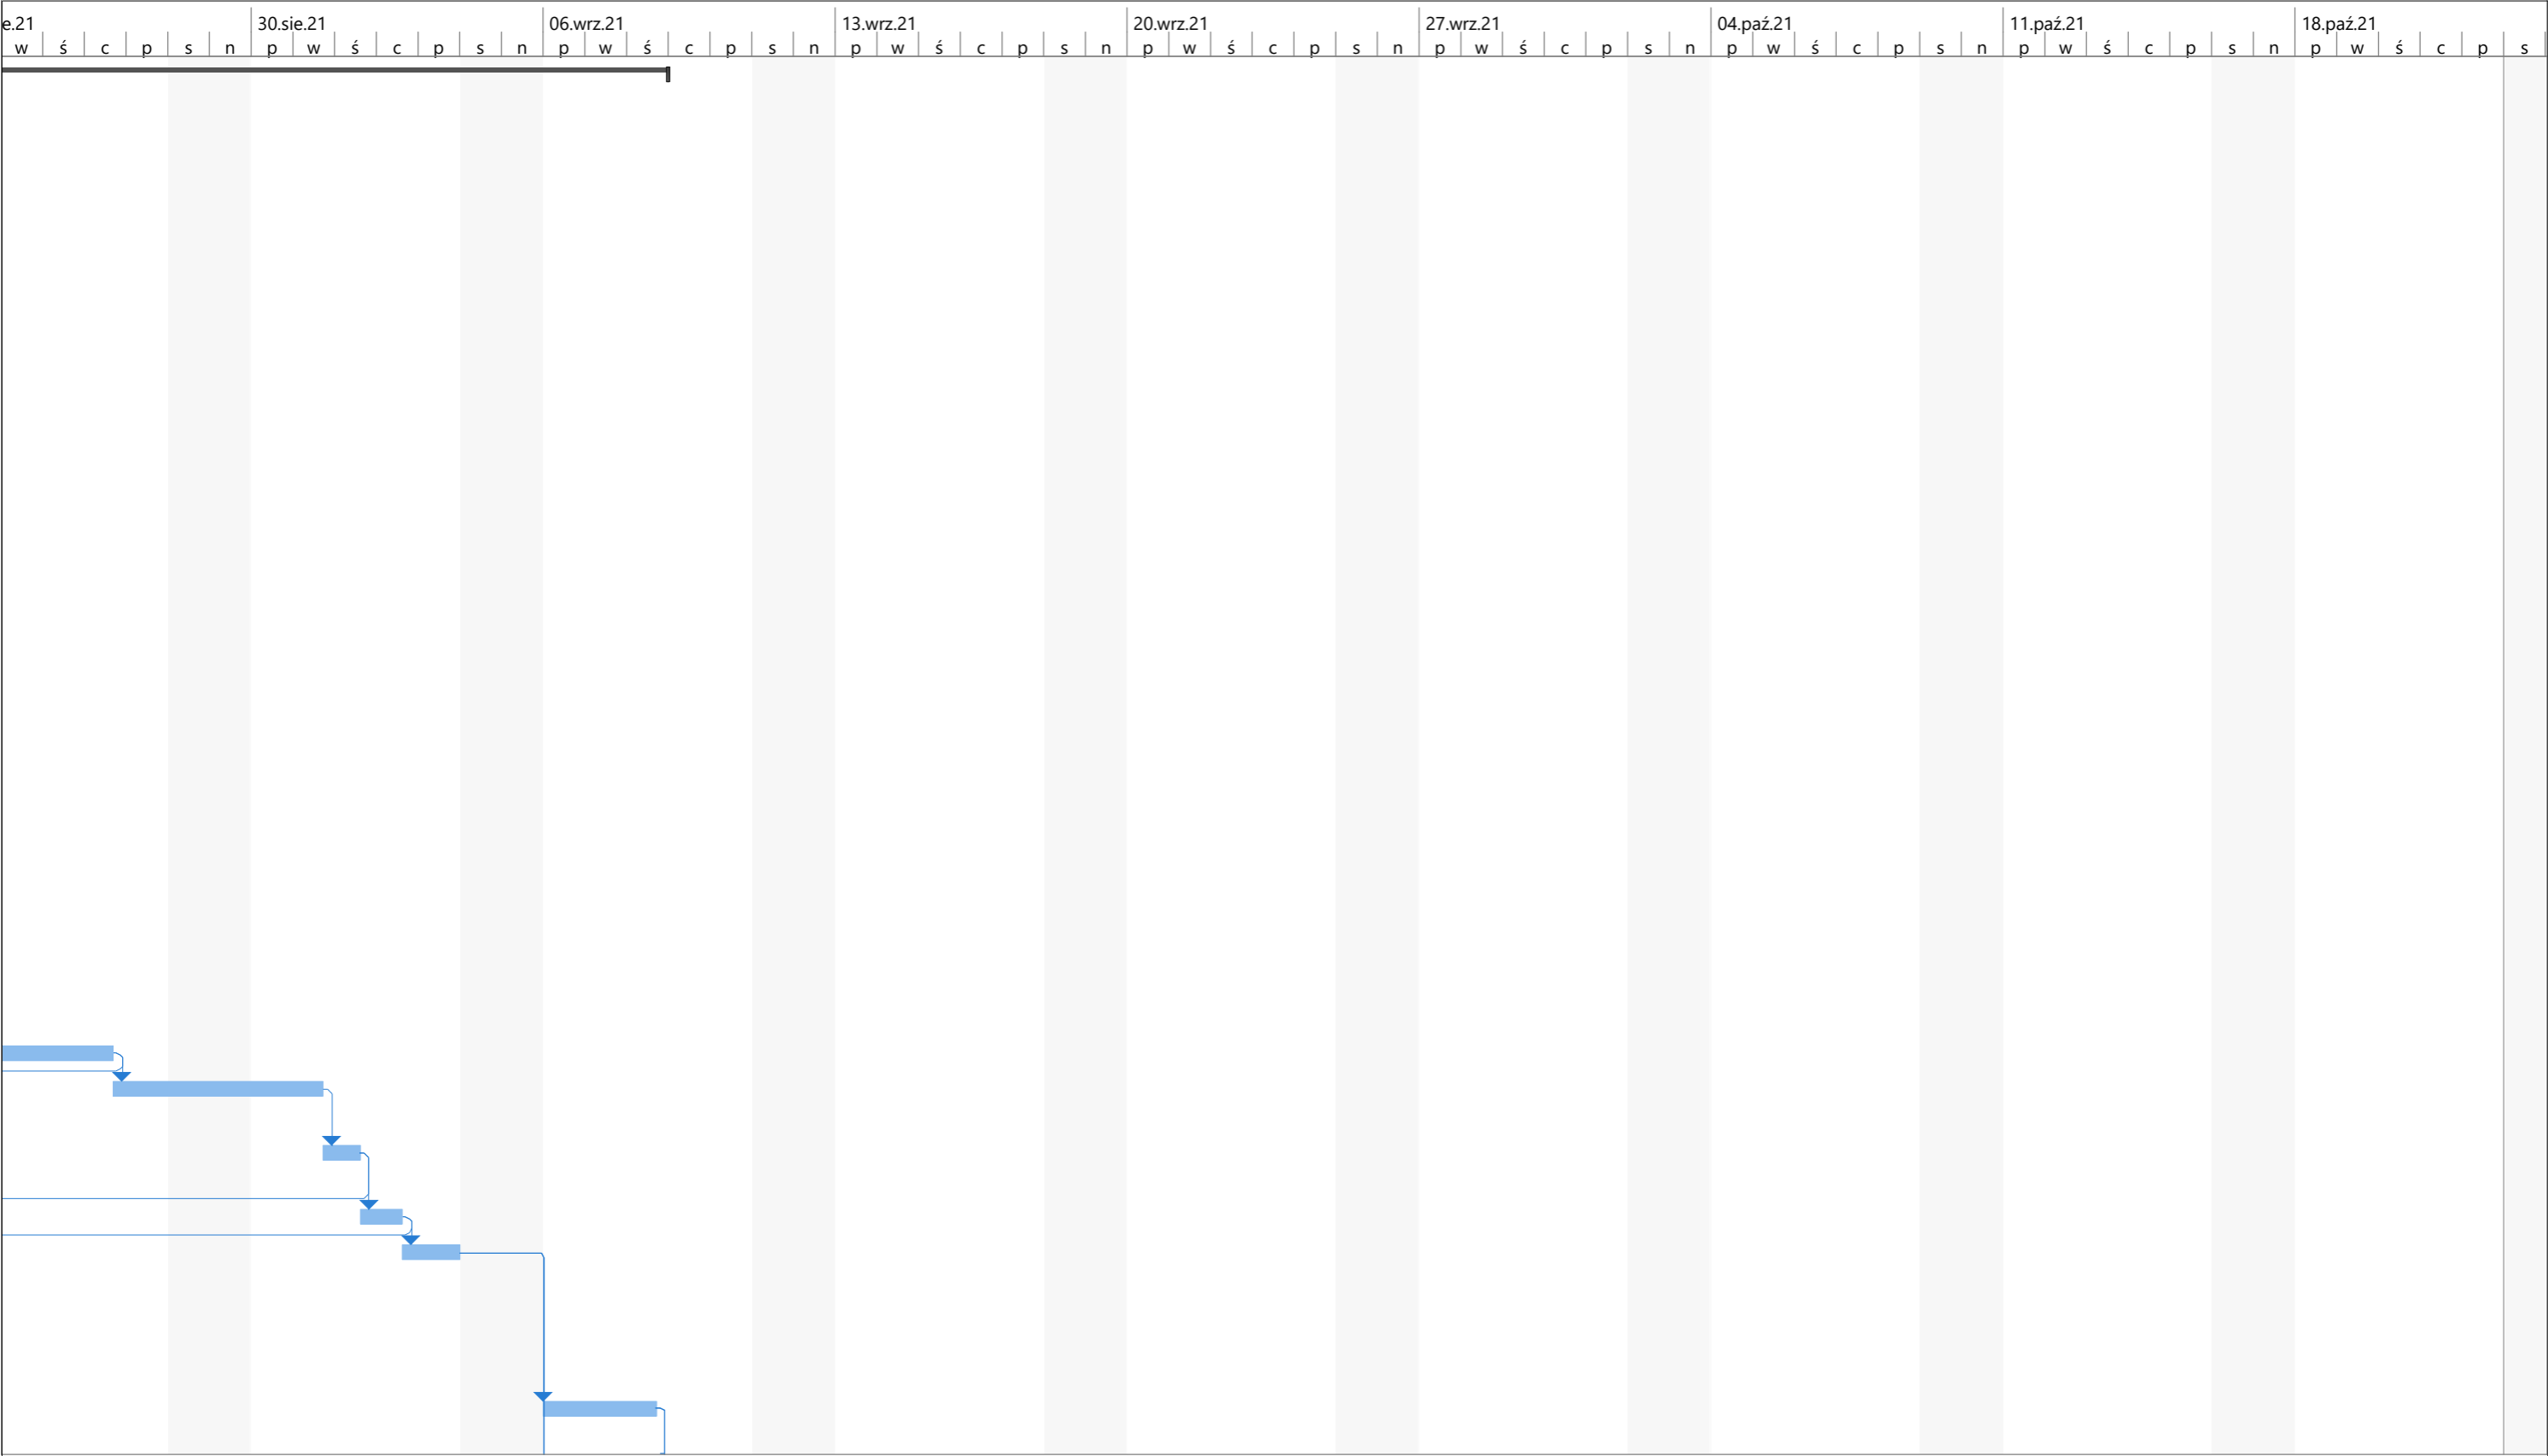

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Projekt: Simple Project Plan Data: pią, 13.08.21 | Zadanie | | Zadanie nieaktywne | | Rzutowanie podsumowania ręcznego | | Zewnętrzne punkty kontrolne | |
| | Podział | | Nieaktywny punkt kontrolny | | Podsumowanie ręczne | | Termin ostateczny | |
| | Punkt kontrolny | | Podsumowanie nieaktywne | | Tylko z rozpoczęciem | | Postęp | |
| | Podsumowanie | | Zadanie ręczne | | Tylko z zakończeniem | | Ręczne (postęp) | |
| | Podsumowanie projektu | | Tylko z czasem trwania | | Zadania zewnętrzne | | | |

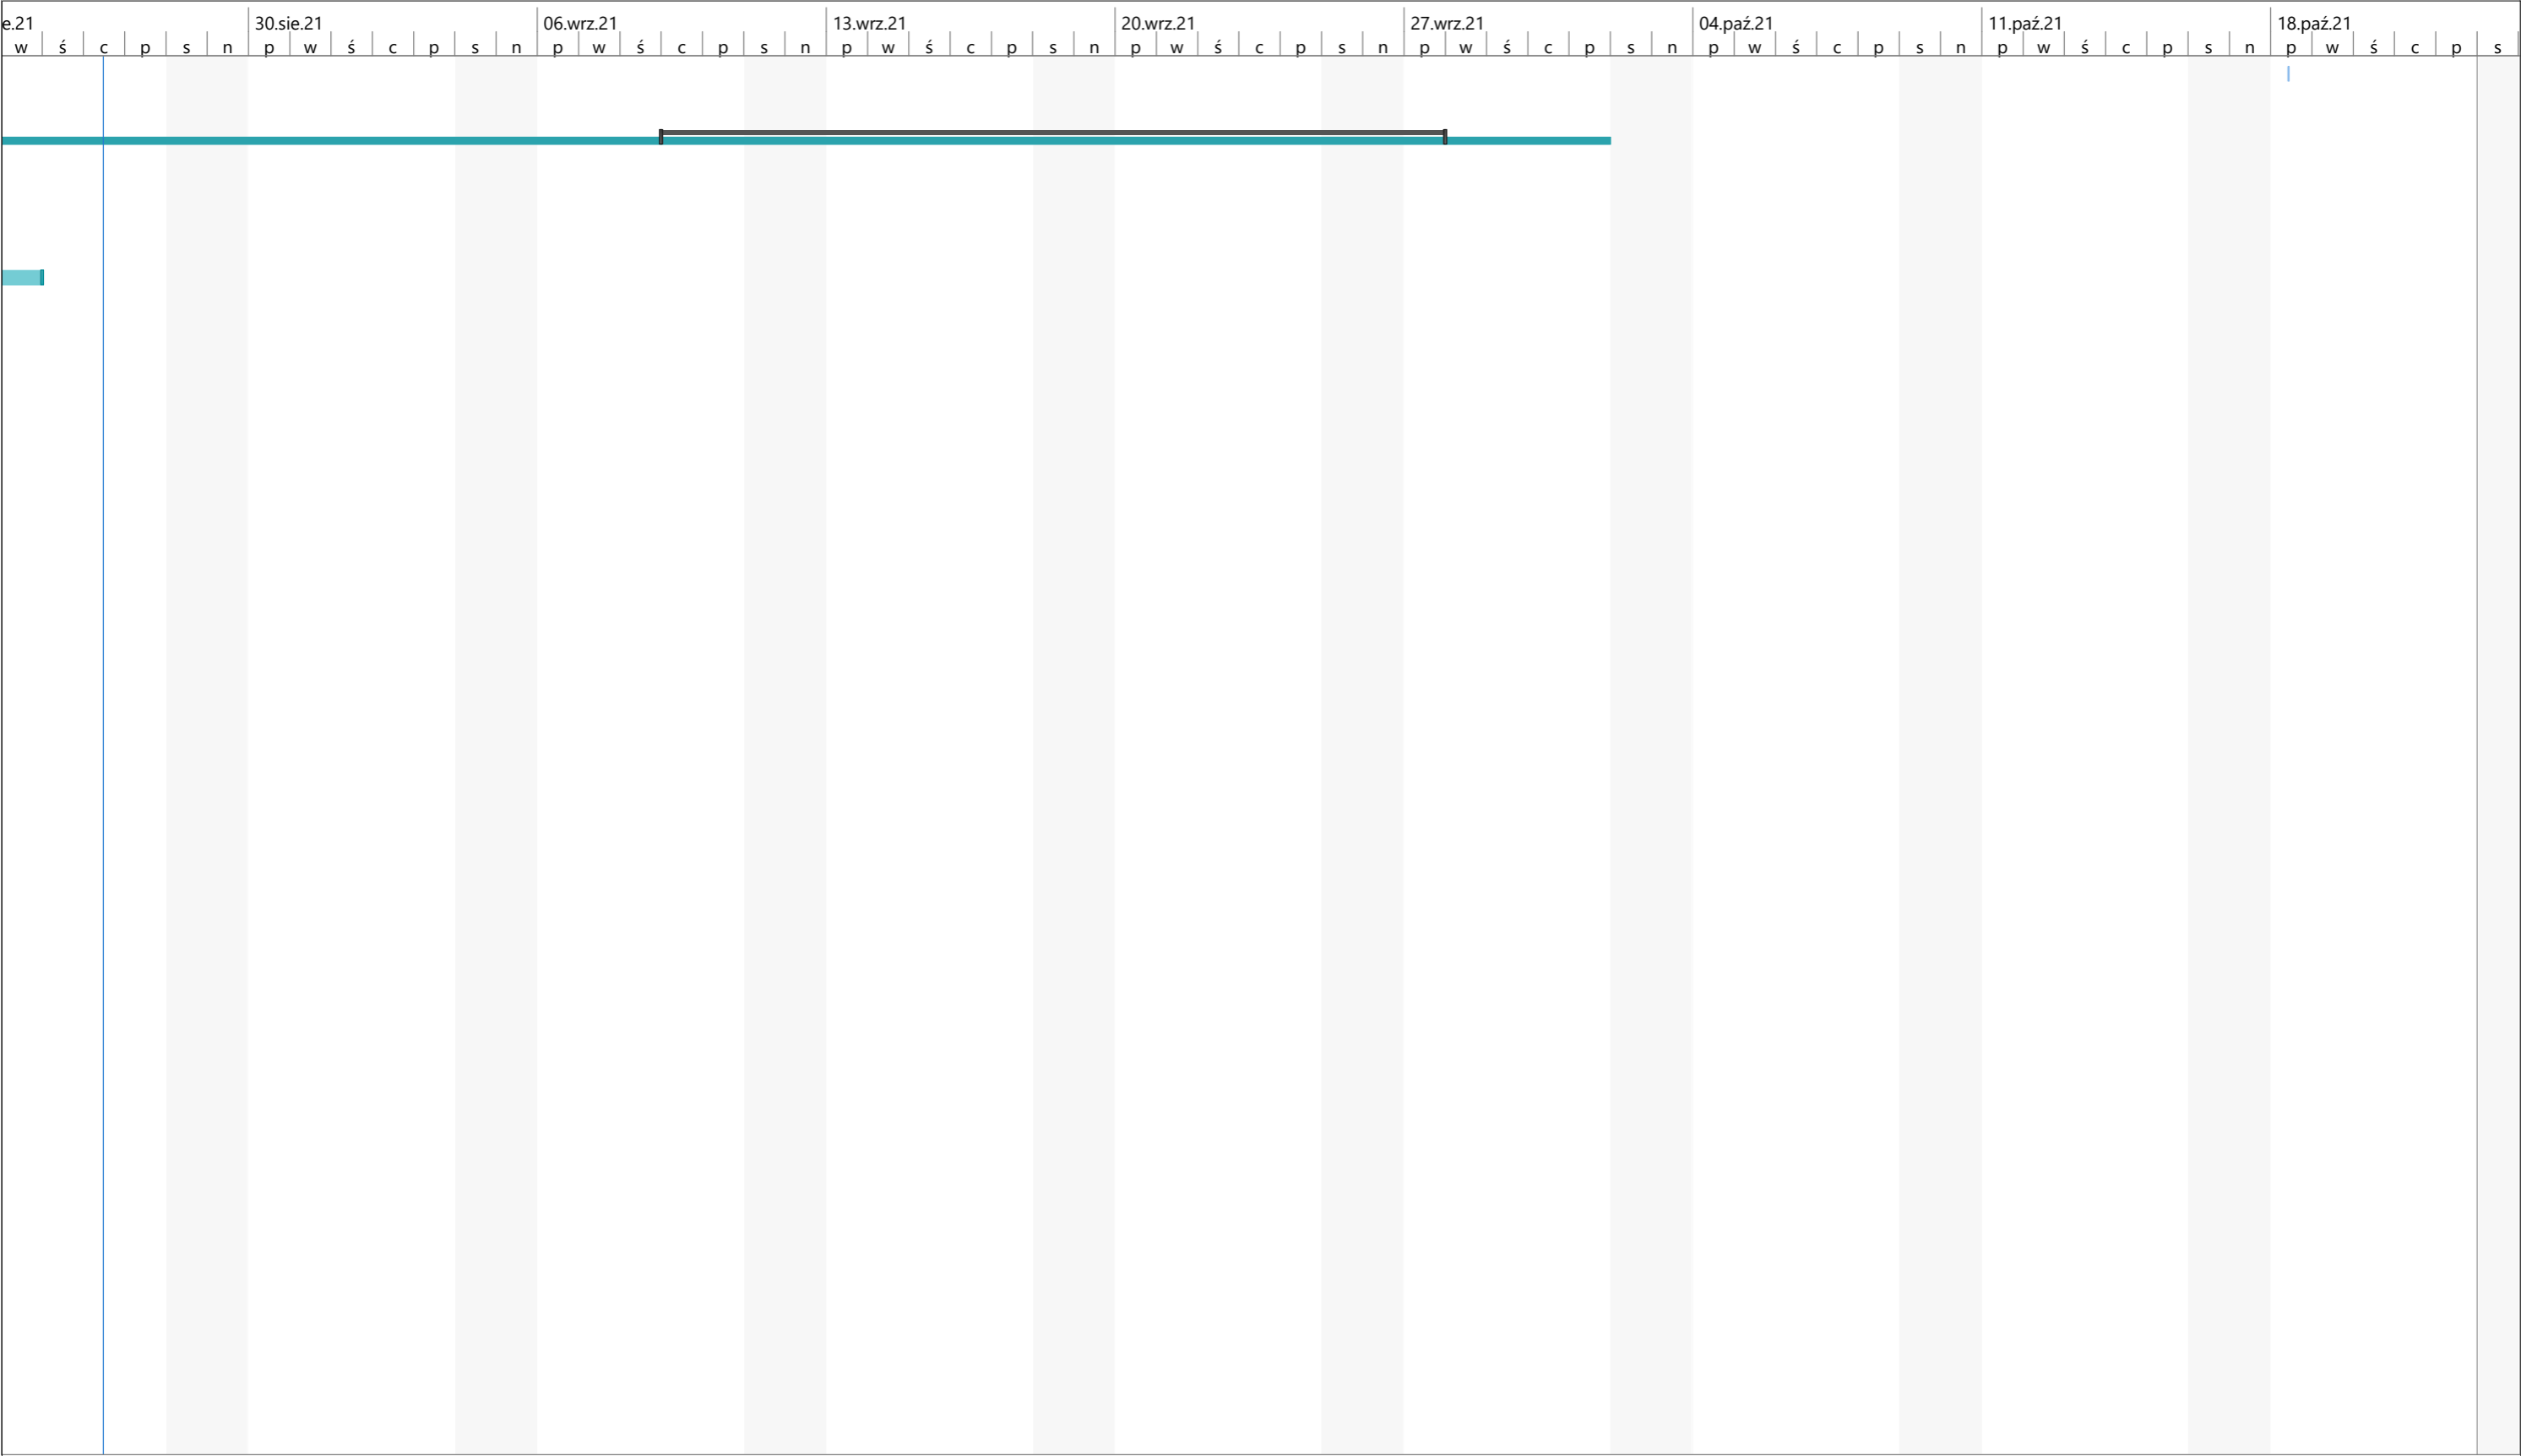

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Projekt: Simple Project Plan Data: pią, 13.08.21 | Zadanie | | Zadanie nieaktywne | | Rzutowanie podsumowania ręcznego | | Zewnętrzne punkty kontrolne | |
| | Podział | | Nieaktywny punkt kontrolny | | Podsumowanie ręczne | | Termin ostateczny | |
| | Punkt kontrolny | | Podsumowanie nieaktywne | | Tylko z rozpoczęciem | | Postęp | |
| | Podsumowanie | | Zadanie ręczne | | Tylko z zakończeniem | | Ręczne (postęp) | |
| | Podsumowanie projektu | | Tylko z czasem trwania | | Zadania zewnętrzne | | | |

