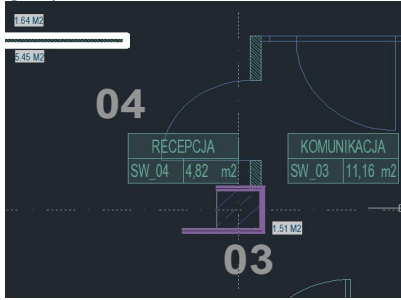
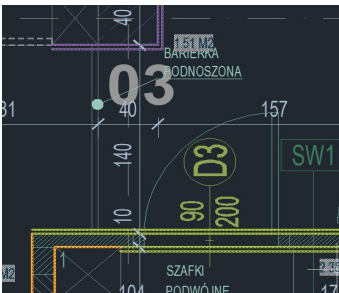
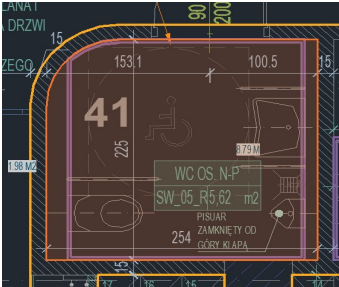

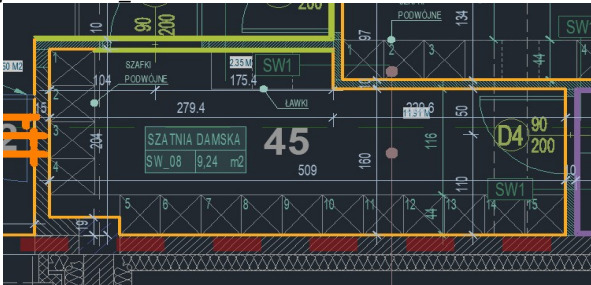

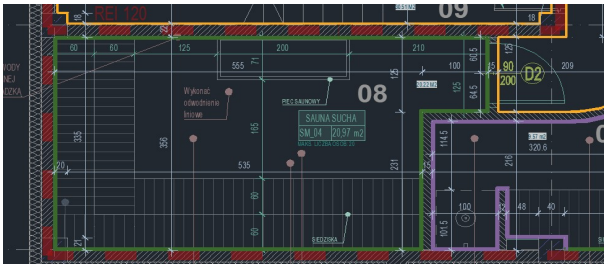





Lp.	Nr pomieszczenia	Pytanie	Odpowiedzi
1	SW_01	Proszę o wskazanie wymiarów logotypu o którym mowa w "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD". Proszę o przesłanie logo w pliku krzywych jeżeli mają Państwo lub o zdjęcie poglądowe do wyceny	W zakresie Wykonawcy jest doprowadzenie podłączenia elektrycznego. Logo zostanie dostarczone w trakcie Inwestycji.
2	SW_01	Proszę o podanie Wymaganej odporności ogniowej drzwi DZ	Drzwi istniejące EI60 do wymiany na zestaw EI60 przeszklony
3	SW_02	Proszę o wskazanie prawidłowego poziomu sufitu na przekroju wskazywany jest poziom 200 cm natomiast na rzucie sufitów 290 cm	Wysokość pomieszczenia - 290cm, na przekroju uwzględniono poziom spodu stropu mierzony od 0 projektowego.
4	SW_02	Proszę o wskazanie wysokości drzwi oraz wysokości całkowitej drzwi szklanych z ścianą szklaną - brak wymiarów na rysunkach	wysokość w świetle przejścia - 220cm, h otworu na drzwi ze ścianą szklaną - wysokość do spodu sufitu - 290cm
5	SW_02	W pomieszczeniu wsazano sufit napinany, natomiast wskazano że oświetlenie użytkowe będzie stanowić lampa sufitowa czy takie stwierdzenie należy rozumieć że sufit napinany będzie miał podświetlenie ?	w ramach projektu wykonawczego projektu IE należy przewidzieć oprawy wpuszczane lub montowane na suficie napinanym, nie przewiduje się poświetlanych sufitów napinanych, należy przeliczyć natężenie i dobrać oprawy na etapie projektu wykonawczego
6	SW_03	Proszę o wskazanie w jaki sposób mają być wykończone ściany oznaczone na rysunku. Nie wskazano wykończenia w projekcie przetargowym 	wskazano w legendzie znajdującej się w prawym dolnym rogu rysunku: -żółta linia - ściana tynkowana, linia zielona - boazeria, fornir, linia fioletowa - płytki, spieki lub kafelki; sugerowane produkty wg załącznika 1 - WNĘTRZA I BRANŻE, należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy na podstawie projektu koncepcyjnego - modelu 3d i wizualizacji
7	SW_03	Proszę o podanie wykończenia ławki - brak wytycznych odnośnie siedziska, wykończenia nóg, długości, wysokości	drewno - do uzupełnienia wg projektu warsztatowego, wykonawczego
8	SW_03	W "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" opisano w wytycznych meblowych że Wykonawca ma zrobić kinkiet, natomiast nie jest on ujęty w wytycznych elektrycznych. Proszę o informację czy jest to błąd czy należy go ująć w wycenie. Dodatkowo proszę o przesłanie skorygowanego pliku w tym zakresie.	Ilość kinkietów i miejsce ich montażu jest uzależniony od ostatecznego projektu aranżacji za który odpowiada Wykonawca.
9	SW_03	W pomieszczeniu wsazano sufit napinany, natomiast wskazano że oświetlenie użytkowe będą stanowić 3 lampy sufitowe czy takie stwierdzenie należy rozumieć że sufit napinany będzie miał podświetlenie? Czy oświetlenie będzie podwieszane poniżej sufitu.? Jeżeli podwieszane poniżej proszę o informację o kształcie, barwie, wymiarach itp lamp	w ramach projektu wykonawczego projektu IE należy przewidzieć oprawy wpuszczane lub montowane na suficie napinanym, nie przewiduje się poświetlanych sufitów napinanych, należy przeliczyć natężenie i dobrać oprawy na etapie projektu wykonawczego
10	SW_03	Na rysunku znajduje się bramka podnoszona. Natomiast nie ma jej w pliku "zał nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" związku z czym proszę o informację czy brama jest w zakresie GW? Jeżeli jest proszę o podanie czy ma być ona sterowa, w jaki sposób. Dodatkowo proszę o wytyczne materiałowe. 	Wykonawca w ramach umowy powinien przewidzieć montaż dipoda wejściowego wraz z podłączeniem zasilania oraz sterowania zgodnie z wytycznymi ESOK.


11	SW_03	Czy drzwi D3 w tym pomieszczeniu powinny być zlicowane z okładziną fornirową widoczną na rysunkach? Czy drzwi są szklane czy drewniane?	drzwi D3 są drewniane bez większych prześwitów, powinny być zlicowane z okładziną fornirową od strony komunikacji (pom. SW_03)
12	SW_04	Proszę o wskazanie wykończenia zabudowy meblowej. Laminat/HPL/Fornir itp. Wykonanie z płyty trudnozaplanej czy zwykłej	zabudowa meblowa - płyty MDF NRO fornirowane (tożsame z okładziną ścienną) oraz płyty MDF NRO laminowane, zabezpieczone przed wilgocią
13	SW_04	Proszę o wskazanie parametrów drukarni, wymiarów, technologii itp. lub o informację czy jest ona w zakresie	drukarka A4, laserowa np. HP LaserJet Pro 4102fdw
14	SW_04	Proszę o wskazanie wysokości kurtyn ppoż zaprojektowanych, czy kurtyna ma być mocowana do stropu, czy w nadprożu z płyt GK. Proszę o wskazanie	należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy, dopuszcza się montaż na granicy sufitu podwieszanego wraz z zamknięciem przestrzeni nadsufitowej dla zachowania ciągłości odporności
15	SW_04	Czy stanowisko POS razem z kasą fiskalną, terminalem płatniczym i terminalem multisport. Jest w zakresie GW ?	Tak
16	SW_04	Czy zegar zgodny z systemem z automatyczną regulacją czasu dostosowany wizualnie do aranżacji. Jest w zakresie GW ?	Tak
17	SW_04	Proszę o wskazanie wymiarów, umiejscowienia oraz plików w krzywych lub wizualizacji logotypu	W zakresie Wykonawcy jest doprowadzenie podłączenia elektrycznego. Logo zostanie dostarczone w trakcie Inwestycji.
18	SW_04	Proszę o wskazanie wymiarów, technologii oraz pozostałych wymagań odnośnie telewizora	Wymiar telewizorów jest uzależniony od ostatecznego projektu aranżacji za który odpowiada Wykonawca.
19	SW_04	Proszę o informację co oznacza zapis dotyczący ścian tynk RAL 1019 lub 1013? Czy chodzi o malowanie tynków istniejących farbą czy Generalny Wykonawca musi wykonać tynki o kolorze RAL opisany powyżej ?	ścianę pokryć tynkiem i malować farbą w podanym kolorze RAL lub NCS
20	SW_04	W pomieszczeniu wskazano sufit napinany, natomiast wskazano że oświetlenie użytkowe będzie stanowić lampa sufitowa czy takie stwierdzenie należy rozumieć że sufit napinany będzie miał podświetlenie?	w ramach projektu wykonawczego projektu IE należy przewidzieć oprawy wpuszczane lub montowane na suficie napinanym, nie przewiduje się poświetlanych sufitów napinanych, należy przeliczyć natężenie i dobrać oprawy na etapie projektu wykonawczego
21	SW_05R*	Proszę o doprecyzowanie czy Inwestorowi zależy na krawędzi ukrytej X czy opadającej E. Lub czy chodzi o sufit gipsowo-kartonowy z płyty cichej, zwykłej typ A, czy perforowanej?	krawędź ukryta X, płyta pełna
22	SW_05R*	Proszę o wskazanie czy podajnik papieru, dozownik mydła, uchwyt na papier, szczotka do WC, suszarka itp. mają być wykonane z plastiku czy metalowe ?	metalowe
23	SW_05R*	Proszę o informację czy WC dla osób niepełnosprawnych powinien być na stelażu? Czy stojący?	na stelażu
24	SW_05R*	Proszę o potwierdzenie że w pomieszczeniu SW_05R* znajdować się ma prysznic ponieważ brak go na rysunkach aranżacji. 	potwierdzamy


25	SW_05R*	Proszę o informację w jakich proporcjach na ścianach występują płytki Dunin oraz Beren w tym pomieszczeniu ponieważ na rysunkach okładzina wszędzie rysowana jest tym samym kolorem natomiast w pliku "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" są wymienione 2 rodzaje płytek	proporcje i układ płytek wg projektu wykonawczego, to ok 80% na recz płytek Beren, reszta Dunin - mozaika
26	SW_06	Czy drzwi D4 w tym pomieszczeniu powinny być zlicowane z okładziną fornirową widoczną na rysunkach? Czy drzwi są szklane czy drewniane?	drzwi D4 są drewniane bez większych prześwitów, powinny być zlicowane z okładziną fornirową od strony szatni (pom. SW_06), należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
27	SW_06	Proszę o podanie typu wykończenia szafek na buty - laminat, hpl, fornir ?	hpl
28	SW_06	Proszę o wskazanie wymiarów oraz wymagań lustra. Czy ma być fazowane na krawędziach, zabezpieczone, hartowane ?	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji, należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
29	SW_07	Proszę o wskazanie materiału z którego ma być wykonane wydzielenie. Laminat, HPL, Fornir ? 	hpl
30	SW_07	Proszę o wskazanie wymiarów oraz wymagań lustra. Czy ma być fazowane na krawędziach, zabezpieczone, hartowane ?	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji, należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
31	SW_07	proszę o potwierdzenie ilości oświetlenia oraz kinkietów. Lampy ilość 2 szt Kinkiety ilość 3 szt Wg Nas powinien być 1 kinkiet nad lustrem	Ilość kinkietów i miejsce ich montażu jest uzależniony od ostatecznego projektu aranżacji za który odpowiada Wykonawca.
32	SW_08	Proszę o podanie typu wykończenia szafek na buty - laminat, hpl, fornir ?	hpl
33	SW_08	Proszę o wskazanie wymiarów oraz wymagań lustra. Czy ma być fazowane na krawędziach, zabezpieczone, hartowane ?	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji, należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
34	SW_08	Dzień dobry, na rysunku wskazano wyłącznie ławki oraz szafki podwójne proszę o informację gdzie znajdują się szafki na buty bez ławki które są wymienione w pliku "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" 	szafki na buty znajdują się pod ławkami i szafkami, należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy 
35	SW_09	Proszę o informację z jakiego materiału ma być wykonana półka pod prysznic. Z płytki czy gotowa metalowa ?	metalowa
36	SW_10	Proszę o wskazanie wymiarów, umiejscowienia oraz plików w krzywych lub wizualizacji logotypu	W zakresie Wykonawcy jest doprowadzenie podłączenia elektrycznego. Logo zostanie dostarczone w trakcie Inwestycji.

37	SW_10	Co autor projektu w wytycznych meblowych ma opisywać "montaż city light" - 2 szt są to oprawy, oznaczenie wyjścia ?	Citylight to podświetlana tablica ogłoszeniowa. W zakresie Wykonawcy jest doprowadzenie podłączenia elektrycznego
38	SM_01	Proszę o wskazanie jakie źródło wody ma być zainstalowane zgodnie z wytycznymi wyposażenia/mebli ? Metalowe, plastikowe itp.	Szczegółowy opis zamieszczony jest w PFU pkt 6.10
39	SM_01	Opis elektryczny mówi o konieczności podzielenia obwodów na oświetleniowe i porządkowe natomiast w pomieszczeniu tym brak wytycznych odnośnie ilości gniazdek. Proszę o doprecyzowanie	ilość gniazd elektrycznych podana jest w dziale wyposażenie. 8 szt.
40	SM_01	W pomieszczeniu wsazano sufit napinany, natomiast wskazano że oświetlenie użytkowe będą stanowić 11 lampy sufitowe czy takie stwierdzenie należy rozumieć że sufit napinany będzie miał podświetlenie? Czy oświetlenie będzie podwieszane poniżej sufitu.? Jeżeli podwieszane poniżej proszę o informację o kształcie, barwie, wymiarach itp lamp	w ramach projektu wykonawczego projektu IE należy przewidzieć oprawy wpuszczane lub montowane na suficie napinany, nie przewiduje się poświetlanych sufitów napinanych, należy przeliczyć natężenie i dobrać oprawy na etapie projektu wykonawczego
41	SM_02	Proszę o wskazanie długości szerokości desek, rodzaju drewna itp.	Rodzaj drewna został wskazany w kolumnie wyposażenie (abachi). Ostateczne wymiary uzależnione są od projektu warsztatowego saun za który odpowiedzialny jest Wykonawca
42	SM_02	Na rysunkach okładzin ściennych są jedynie 2 oznaczenia, jedno zapewne dotyczy płytek natomiast drugie oznaczenie to okładzina z desek, natomiast załącznik "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" opisuje 2 rodzaje płytek, oraz dodatkowo jeden z tych rodzajów ma 2 podtypy proszę o uszczegółowienie, jakich rodzajów jest ile i w jakim miejscu	proporcje i układ płytek wg projektu wykonawczego, wstępna aranżacja wg koncepcji 3d
43	SM_03	Proszę o potwierdzenie że wszystkie rodzaje sufitów są na jednym poziomie, ponieważ nie wynika to z opisu ani rysunków.	były ustalane na podstawie stanu istniejącego - wysokości nie były jednolite
44	SM_04	Proszę o potwierdzenie że wszystkie rodzaje sufitów są na jednym poziomie, ponieważ nie wynika to z opisu ani rysunków.	były ustalane na podstawie stanu istniejącego - wysokości nie były jednolite
45	SM_04	Proszę o potwierdzenie czy w saunie suchej występuje jeden rodzaj sufitu jak wynika z opisu "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" czy 2 jak wynika z rysunku. Na rysunku mamy sufit z desek drewnianych oraz napinany 	Ostateczne rodzaj sufitu uzależniony jest od projektu warsztatowego saun za który odpowiedzialny jest Wykonawca.
46	SM_04	Proszę o potwierdzenie że drzwi D2- oznaczone na rysunku to drzwi szklane w ramie, ponieważ na rysunku ścian oznaczono również okładzinę drewnianą również w tym miejscu, co może oznaczać również drzwi zwykłe okładane od wewnątrz drewnem 	D2 - drzwi szklane, szczegółowy opis w kolumnie wyposażenie

47	SM_04	Proszę o potwierdzenie że w pomieszczeniu nie wykonujemy nowego oświetlenia tylko wykorzystujemy istniejące ?	Wytyczne w/s oświetlenia w pomieszczeniu SM_04 zostały sprecyzowane w wierszu oświetlenie.
48	SM_06	Opis elektryczny mówi o konieczności podzielenia obwodów na oświetleniowe i porządkowe natomiast w pomieszczeniu tym brak wytycznych odnośnie ilości gniazdek. Proszę o doprecyzowanie	pomieszczenie SM_06 jest strefą schładzania. Zamawiający nie przewiduje montażu gniazdek w tej strefie
49	SM_07	Proszę o wskazanie koloru malowania sufitu	Ostateczny rodzaj sufitu i jego kolor uzależniony jest od projektu warsztatowego saun za który odpowiedzialny jest Wykonawca.
50	SM_07	Proszę o wskazanie w jakich miejscach przewidziane jest podświetlenie RGB, brak na rysunkach	Ostateczne podświetlenie uzależnione jest od projektu warsztatowego saun za który odpowiedzialny jest Wykonawca.
51	SM_07	W opisie wyposażenia oraz mebli opisano że na suficie znajdować się ma 6 szt lamp, kolor RGB, natomiast w opisie wytycznych elektrycznych napisano że należy wykonać 5 lamp + 1 kinkiet. Proszę o informację która wersja jest ostateczną wytyczną	Ostateczne podświetlenie uzależnione jest od projektu warsztatowego saun za który odpowiedzialny jest Wykonawca.
52	SZ_01	Na rysunku 2 szt drzwi opisano jako D4, są to wg opisu te same drzwi co do sanitariatów, które mają być zlicowane z okładziną. Związku z tym że całe pomieszczenie ma być malowane proszę o określenie strony licowania. Lub potwierdzenie wykończenia drzwi 	w obecnej fazie projektu drzwi były wyróżnione tylko ze względu na typ wg legendy, strona licowania i wykończenie na etapie wykonawczym
53	SZ_01	W jaki sposób mają być wykończone drzwi D5 - czy można je wykonać jako drzwi stalowe ?	tak, ale należy je wykończyć pokryciem w kolorze ścian wg projektu wykonawczego
54	SZ_02	Na rysunku 3 szt drzwi opisano jako D4, są to wg opisu te same drzwi co do sanitariatów, które mają być zlicowane z okładziną. Związku z tym że całe pomieszczenie ma być malowane proszę o określenie strony licowania. Lub potwierdzenie wykończenia drzwi	w obecnej fazie projektu drzwi były wyróżnione tylko ze względu na typ wg legendy, strona licowania i wykończenie na etapie wykonawczym
55	SZ_03	Proszę podanie wykończenia międzyszafkowego ponieważ w pliku nie ma wymienionych płytek na co wskazują oznaczenia na rysunkach	ten sam materiał co blat aneksu, wg projektu wykonawczego
56	SZ_03	Proszę o wskazanie wytycznych odnośnie wykończenia zabudów meblowych. Laminat, HPL, lakierowanie ? 	należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
57	SZ_03	Proszę o wskazanie wytycznych odnośnie wykończenia szafki na żywność. Laminat, HPL, lakierowanie ? 	gotowy produkt lub hpl należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy

58	SZ_04	Proszę o informację czy sufit w pomieszczeniu ma być wykonany z płyt modułowych 60x60 cm czy zgodnie z z plikiem <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> " Jeżeli odpowiedź będzie że należy wykonać sufit modułowy. Proszę o określenie jego parametrów akustycznych oraz typu krawędzi	zakłada się sufit modułowy, krawędź ukryta, z parametrami zgodnymi z warunkami technicznymi na etapie projektu wykonawczego, powierzchnia gładka (domyślnie z wełną mineralną po stronie technicznej)
59	SZ_04	Proszę o określenie materiału oraz pozostałych parametrów szafek pracowniczych	hpl
60	SZ_04	Proszę o określenie materiału oraz parametreów szafy porządkowej	hpl
61	SZ_05	Proszę o informację czy sufit w pomieszczeniu ma być wykonany z płyt modułowych 60x60 cm czy zgodnie z z plikiem <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> " Jeżeli odpowiedź będzie że należy wykonać sufit modułowy. Proszę o określenie jego parametrów akustycznych oraz typu krawędzi	zakłada się sufit modułowy, krawędź ukryta, z parametrami zgodnymi z warunkami technicznymi na etapie projektu wykonawczego
62	SZ_05	Proszę o wskazanie wymiarów oraz wykończenia lustra ?	należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
63	SZ_05	Proszę o informację czy suszarka powinna być w wykończeniu metalowym czy plastikowym ?	wykończenie metalowe
64	SZ_06	Proszę o informację czy sufit w pomieszczeniu ma być wykonany z płyt modułowych 60x60 cm czy zgodnie z z plikiem <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> " Jeżeli odpowiedź będzie że należy wykonać sufit modułowy. Proszę o określenie jego parametrów akustycznych oraz typu krawędzi	zakłada się sufit modułowy, krawędź ukryta, z parametrami zgodnymi z warunkami technicznymi na etapie projektu wykonawczego, powierzchnia gładka (domyślnie z wełną mineralną po stronie technicznej)
65	SG_01	Proszę o wskazanie materiałów z jakich mają być wykonane siedziska. Rodzaj laminatu, kolorystkę itp.. Czy posiadają Państwo wizualizację tej strefy?	baza siedzisk - stelaż obłożony płytkami mozaikowymi, siedziska - poduszki obite niepalnym materiałem  
66	SG_01	Proszę o wskazanie ilości oraz rodzajów poduch ujętych w pliku <i>"zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD"</i> ?	należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
67	SG_02	Proszę o wskazanie materiałów zabudowy baru - szafek, szaf, pótek. Rodzaj laminatu, kolorystkę itp.. Czy posiadają Państwo wizualizację tej strefy?	należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
68	SG_02	Proszę o wskazanie materiałów blatu baru. Rodzaj laminatu, kolorystkę itp.. Czy posiadają Państwo wizualizację tej strefy?	należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy
69	SG_02	Czy w zakresie GW jest dostarczanie całego wyposażenia baru tj. kostarek, zmywareki, chłodziarki itp. ?	Tak, zgodnie z zapisami PFU

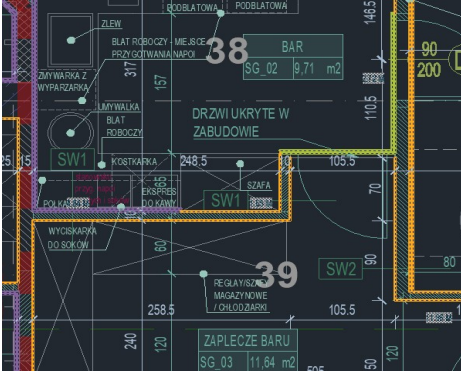70	SG_02	Proszę o wskazanie typu drzwi oraz wytycznych dla drzwi w barze. Brak oznaczeń na rysunkach 	drzwi włączone w zabudowę meblową szafy, wg projektu wykonawczego, wizualizacji i modelu 3d 
71	SG_03	Proszę o wskazanie materiałów szaf magazynowych oraz regałów. Rodzaj laminatu, kolorystkę itp.. Czy posiadają Państwo wizualizację tej strefy?	szafy i regały z płyt meblowych laminowanych ral 7016 lub regały metalowe, wg projektu wykonawczego 
72	SG_03	Proszę o wskazanie wysokości szerokości lodówki z zamrażarką	wg projektu wykonawczego np. Chłodziarka do napojów - 630 litrów - z 2 szklanymi drzwiami & wyświetlaczem reklamowym Szerokość: 925mm - Głębokość: 695mm - Wysokość: 1945mm i np. Szafa mroźnicza, 1-drzwiowa, ze stali nierdzewnej, 361 l, 0,15 kW
73	SG_03	Proszę o potwierdzenie że drzwi do pomieszczenia serweronni opisane jako D5 mają być bezklasowe.	tak, bezklasowe
74	SG_04	Proszę o wskazanie miejsca paneli ściennych wymienionych w pomieszczeniu ponieważ na rysunkach oznaczono wyłącznie malowanie. Dodatkowo proszę o wskazanie materiału oraz wymiarów paneli 	wskazano na rysunku opisowo, oraz zaznaczono podwójną żółtą linią

75	SS_01	Proszę o podanie wymagań akustycznych fasady jeżeli są oraz o podanie wysokości szklenia. 	h szklenia = h pomieszczenia, wymagania akustyczne na etapie projektu wykonawczego, (domyślnie parametr akustyczny jak przegroda, pomieszczenie pokój biurowy-korytarz)
76	SS_01	Proszę o wskazanie materiału z którego mają być wykonane ławki. Laminat, HPL, drewno ? Z czego mają być wykonane nogi ?	ławki powinny zostać wykonane z płyty meblowej fornirowanej
77	SS_01	Proszę o wskazanie materiału z którego mają być wykonane półki nad ławkami . Laminat, HPL, drewno ?	półki powinny zostać wykonane z płyty meblowej fornirowanej
78	SS_01	Z rysunku wynika że sufit fornirowy powinien być podświetlany. Proszę o informację czy ma to być LED czy mają to być oprawy? Czy posiadają Państwo wizualizację tej strefy ?	LED 
79	SS_01	Proszę o informację w sprawie wymagań drzwi D1. Izolacyjności akustycznej, wyposażenia w samozamykacz itp.	podwyższona izolacyjność akustyczna, bez samozamykaczy parametry na podstawie projektu wykonawczego
80	SS_02	W opisie "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" na podłodze powinny być 2 rodzaje płytek natomiast na rysunku jest wyłącznie płytka in_wood natur. Proszę o potwierdzenie że na podłodze będzie wyłącznie jednak płytka lub rewizję rysunku	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
81	SS_02	Proszę o podanie wymiarów cegły solnej.	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
82	SS_02	Proszę o podanie na których ścianach będzie płytka Beren Light Grey ponieważ zgodnie z oznaczeniami na ścianach jest wyłącznie malowanie oraz cegła solna	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
83	SS_02	Czy w zakresie prac jest dostawa leżaków ?	tak
84	SS_02	W opisie "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" mowa jest o zasłonach proszę o podanie rodzaju materiału, procencie marszczenia, długości do ziemi, wymaganiach akustycznych dla materiału, palności. Dodatkowo brak oznaczenia na rysunkach proszę o narysowanie lub określenie długości	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji, zakłada się zasłony na pełną wysokość pomieszczenia
85	SS_02	proszę o wskazanie materiału, wielkości itp oraz miejsca na półkę z okularami. Brak oznaczenia na rysunku	półki drewniane, miejsce zostanie wskazane w projekcie aranżacji
86	SS_03	W opisie "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" mowa jest wyłącznie o malowaniu ściana natomiast na rysunku mamy oznaczenie zielone odpowiadające fornirowi/panelom drewnianym. Proszę o potwierdzenie że w tym pomieszczeniu GW ma zamontować panele drewniane/fornir	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
87	SS_03	Czy w zakresie GW jest dostarczanie leżaków ?	tak
88	SS_03	W opisie "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" mowa jest o zasłonach proszę o podanie rodzaju materiału, procencie marszczenia, długości do ziemi, wymaganiach akustycznych dla materiału, palności. Dodatkowo brak oznaczenia na rysunkach proszę o narysowanie lub określenie długości	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
89	SS_03	proszę o wskazanie materiału, wielkości itp oraz miejsca na półkę z okularami. Brak oznaczenia na rysunku	półki drewniane, miejsce zostanie wskazane w projekcie aranżacji
90	SS_03	proszę o informację w sprawie wielkości, wysokości puf. Czy mają być one z materiałów trudnozapalnych? Jakim materiałem wykończone ?	wielkość uzależniona od ostatecznego projektu aranżacji, materiał niebrudzący odporny na wilgoć

91	SS_04	Czy GW w zakresie ma dostarczyć stół do masażu ?	Tak, zgodnie z zapisami PFU pkt 6.23
92	SS_04	Czy GW ma dostarczyć elementy wystroju nawiązujące do Japonii. Jeżeli tak proszę o dokładniejsze wytyczne odnośnie ilości oraz rodzajów elementów	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
93	SS_04	Proszę o wskazanie na których ścianach pomieszczenia znajdują się kolejno, 3 rodzaje płytek ponieważ wszystkie elementy są oznaczone tym samym kolorem. Lub proszę o podanie ilości poszczególnych wykończeń.	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji, wg modelu 3d i wizualizacji 
94	SS_04	Proszę o doprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonana umywalka zintegrowana z blatem.	Kompozyt mineralny lub kamień, wg projektu wykonawczego
95	SS_04	Proszę o informację czy bateria natryskowa oraz bateria umywalkowa mają być elementami podtynkowymi czy natynkowymi ?	bateria natryskowa - podtynkowe, bateria umywalkowa - natynkowa, zintegrowana z blatem
96	SS_04	Zgodnie z plikiem "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" na rysunkach podłóg powinny znajdować się płytki Beren Light Grey natomiast są wyłącznie płytki in wood natural. Proszę o przesłanie rewizji rysunków lub potwierdzenie że w tym pomieszczeniu będzie wyłącznie jeden rodzaj płytek	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji posadzka w pomieszczeniu - in wood natural, posadzka pod prysznicem - beren light
97	SS_05A_R*	Zgodnie z plikiem "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" na rysunkach powinny znajdować się płytki Beren Light Grey natomiast są wyłącznie płytki in wood natural. Proszę o przesłanie rewizji rysunków lub potwierdzenie że w tym pomieszczeniu będą płytki in wood natural	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
98	SS_05A_R*	Zgodnie z plikiem "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" na ścianach poza wykończeniem z płytek Beren Light Grey powinien być również tynk. Proszę o rewizję rysunków lub potwierdzenie że w pomieszczeniu będą wyłącznie płytki	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
99	SS_05A_R*	Proszę o informację czy bateria natryskowa oraz bateria umywalkowa mają być elementami podtynkowymi czy natynkowymi ?	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
100	SS_05A_R*	Proszę o informację z jakiego materiału mają być podajnik, suszarka, dozownik, wieszaki, kosz na śmieci ?	metalowe
101	SS_04 SS_05_R* SS_07 SW_11 SS_08_R	Zgodnie z informacją na rysunku drzwi te powinny się licować z ogłędziną. Rozumiem że skoro na ścianach jest wyłącznie tynk, drzwi należy zlicować od strony korytarza? Czy mają to być drzwi z ukrytą ościeżnicą ?	tak, drzwi mają mieć ukrytą ościeżnicę i licować się ze ścianą od strony korytarza
102	SS_05_R*	Proszę o wskazanie na których ścianach pomieszczenia znajdują się kolejno, 3 rodzaje płytek ponieważ wszystkie elementy są oznaczone tym samym kolorem. Lub proszę o podanie ilości poszczególnych wykończeń.	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
103	SS_05_R*	Zgodnie z plikiem "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" na rysunkach podłóg powinny znajdować się płytki Beren Light Grey natomiast są wyłącznie płytki in wood natural. Proszę o przesłanie rewizji rysunków lub potwierdzenie że w tym pomieszczeniu będą płytki in wood natural	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
104	SS_05_R*	Czy GW w zakresie ma dostarczyć stół do masażu ?	Tak.zgodnie z PFU i kolumnmą wyposażenie.
105	SS_05_R*	Proszę o podanie wielkości oraz innych parametrów TV	Wymar telewizorów jest uzależniony od ostatecznego projektu aranżacji za który odpowiada Wykonawca.

106	SS_05_R*	Czy GW ma dostarczyć elementy wystroju nawiązujące do Chin, Tajlandii oraz Filipin. Jeżeli tak proszę o dokładniejsze wytyczne odnośnie ilości oraz rodzajów elementów	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
107	SS_05_R*	Czy po stronie GW jest dostawa łóżka, szafki, lustra, półek, umywalki czy zgodnie z opisem na rysunkach całe wyposażenie zostaje istniejące ?	po stronie GW jest dostawa
108	SS_05_R*	Czy GW ma w tym pomieszczeniu wymienić oświetlenie.? Zapis "zaleca się" jest nie precyzyjny.	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
109	SS_06	Proszę o informacje czy regały magazynowe i szafy znajdują się w zakresie prac. Ponieważ w pliku " <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> " nie podano ich ilości. Jeżeli znajdują się w zakresie proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane, oraz nośności wymaganej.	nośność półki min. 300kg, magazynowanie do sufitu. Ilość półek oraz materiał uzależniona od aranżacji.
110	SS_07	Proszę o wskazanie na których ścianach pomieszczenia znajdują się kolejno, 3 rodzaje płytek ponieważ wszystkie elementy są oznaczone tym samym kolorem. Lub proszę o podanie ilości poszczególnych wykończeń.	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
111	SS_07	Zgodnie z plikiem " <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> " na rysunkach podłóg powinny znajdować się płytki Beren Light Grey natomiast są wyłącznie płytki in wood natural. Proszę o przesłanie rewizji rysunków lub potwierdzenie że w tym pomieszczeniu będą płytki in wood natural	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
112	SS_07	Czy GW ma dostarczyć elementy wystroju nawiązujące do Hawajów. Jeżeli tak proszę o dokładniejsze wytyczne odnośnie ilości oraz rodzajów elementów	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
113	SS_07	Czy GW w zakresie ma dostarczyć stół do masażu ?	Tak.zgodnie z PFU i kolumną wyposażenie.
114	SS_07	Proszę o informację czy bateria natryskowa oraz bateria umywalkowa mają być elementami podtynkowymi czy natynkowymi ?	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
115	SS_07	Proszę o doprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonana umywalka zintegrowana z blatem.	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
116	SS_07	Proszę o informację jaką ilość wieszaków należy przyjąć w pomieszczeniu i jakiego rodzaju?	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
117	SS_07	Proszę o podanie wymiarów lusta oraz technologii wykonania. Proszę o informację w jakim miejscu należy je zamontować	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
118	SS_07	Proszę o informację czy w pomieszczeniu należy wykonać pracę z lampami oświetleniowymi? Brak wytycznych w tym zakresie	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji. Zgodnie z zapisami w wierszu oświetlenie
119	SS_08_R*	Proszę o informację ponieważ " <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> " w pliku opisano 2 typy wykończenia dla tego pomieszczenia płytki oraz tynk. Na rysunku są wyłącznie płytki. Proszę o potwierdzenie że w łazience będą wyłącznie płytki lub rewizję rysunku	tylko płytki na całą wysokość pomieszczenia
120	SS_08_R*	Proszę o informację z jakiego materiału mają być podajnik, suszarka, dozownik, wieszaki, kosz na śmieci ?	metalowe
121	SS_08_R*	Proszę o podanie wymiarów lusta oraz technologii wykonania. Proszę o informację w jakim miejscu należy je zamontować	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
122	SS_08_R*	Proszę o informację ponieważ " <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> " w pliku nie opisano konieczności dostawy poręczy natomiast są one na rysunkach. Czy dostawa poręczy wchodzi w zakres GW ?	tak jest w zakresie GW
123	SS_08_R*	Czy całość wyposażenia w tym pomieszczeniu powinna być dostosowana do osób niepełnosprawnych ?	Tak
124	SS_08_R*	Czy w pomieszczeniu należy na pewno wykonać 3 kinkiety zgodnie z zestawieniem ?	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
125	SS_09	Na rysunku tego pomieszczenia pokazano 3 rodzaje wykończeń podłogi. Natomiast opis " <i>zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD</i> ", zakłada wyłącznie 2 rodzaje wykończeń. Do tego oznaczenia 3 wykończenia brak w legendzie. Proszę o poprawę wszystkich elementów aby były ze sobą spójne.	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji

126	SS_09	Na rysunkach sufitu opisano że sufit powinien składać się z podświetlanych elementów papierowych. Proszę o informację jakiej odporności na ogień powinien być ten sufit. O producenta takich paneli? Lub o zmianę rysunku i wybranie któregoś z elementów opisanych w pliku "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" ponieważ brak spójności pomiędzy rysunkami a opisem	w ramach projektu wykonawczego projektu IE należy przewidzieć oprawy wpuszczane lub montowane na suficie napinanym, nie przewiduje się poświetlanych sufitów napinanych, należy przeliczyć natężenie i dobrać oprawy na etapie projektu wykonawczego
127	SS_09	Czy w zakres prac wchodzi dostawa płytek z czarnej kamionki?	Tak
128	SS_09	Czy w zakres prac wchodzi dostawa kamyków ozdobnych? Jeżeli tak proszę o doprecyzowanie wielkości, materiału ?	Tak, uzależnione od projektu aranżacji
129	SS_09	Czy w zakres prac wchodzi wykonanie słupków dekoracyjnych? Jeżeli tak proszę o informację w sprawie sposobu wykończenia, materiału, umiejscowienia słupków ich wysokości średnicy itp.	Tak
130	SS_09	W opisie "zał. nr 1 PFU opis pomieszczeń_LD" mowa jest o zasłonach proszę o podanie rodzaju materiału, procencie marszczenia, długości do ziemi, wymaganiach akustycznych dla materiału, palności. Dodatkowo brak oznaczenia na rysunkach proszę o narysowanie lub określenie długości	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji, przewiduje się zasłony na pełną wysokość pomieszczenia
131	SS_09	Proszę o przesłanie wymiarów oraz typu dywanika	uzależnione od ostatecznego projektu aranżacji
132	SS_09	proszę o wskazanie materiału, wielkości itp oraz miejsca na półkę z okularami. Brak oznaczenia na rysunku	półki drewniane, miejsce zostanie wskazane w projekcie aranżacji
133		Czy jest możliwość dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty ?	Tak, W celu ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z Panią Lucyną Domańską, tel. 607-291-070. Wizja jest możliwa w godzinach od godz. 8.00 do 12.00.
134		Czy jest możliwość obniżenia wymagań Zamawiającego z "co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu zespołu saun w obiektach użyteczności publicznej typu aquapark o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto" na 800.000 zł brutto w ciągu ostatnich 10 lat ?	Nie, Zamawiający nie zmienia warunku.
135		Czy jest szansa na kolejne przesunięcie składania ofert na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj minimum na dzień 04 lipca 2025 r. ?	Nie, Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
