

**TT-066-0218-06193-24**  
Zlecenie: 0016/02/24 W

Chrzanów, 09.08.2024 r.

**Gmina Chrzanów  
Urząd Miejski w Chrzanowie  
ul. Aleja Henryka 20  
32-500 Chrzanów**

**Adres do korespondencji:  
Czernecki Jakub  
Os. Gaj 24/9  
32-540 Trzebinia**

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji pn: „Remont drogi gminnej ul. Zaulek w Balinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2024 r. Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informuje, że uzgadnia przedłożone zadanie inwestycyjne na warunkach:

1. Na załączonej mapie sytuacyjnej wskazano orientacyjny przebieg istniejącej sieci wodociągowej (kolorem niebieskim) zinventaryzowanej oraz pozostającej w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa.
2. Prace prowadzi pod nadzorem przedstawiciela Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. Nadzór należy zlecić pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Nadzór jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
3. Dokładne położenie i głębokość posadowienia naniesionych sieci należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy zabezpieczyć je i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru.
4. Należy zachować szczególną ostrożność oraz normatywne odległości przy posadawianiu projektowanej infrastruktury względem istniejącej sieci wodociągowej, (zgodnie z wytycznymi do projektowania dostępnymi na stronie [https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wytyczne\\_dla\\_projektantow\\_i\\_wykonawcow/](https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wytyczne_dla_projektantow_i_wykonawcow/)).
5. Wszystkie zblżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy zachować minimalne przykrycie istniejących sieci uniemożliwiające ich zamarzanie (minimum 1,4 m).
7. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy nie przekraczać maksymalnego przykrycia istniejącej sieci wodociągowej (maximum 3,0 m).
8. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
9. Uzbrojenie sieci wodociągowej wyprowadzić do niwelety projektowanej nawierzchni.
10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz

W razie odpowiedzi prosimy powoływać się na znak pisma. Sprawę prowadzi **Krzysztof Wierzbic tel. 32 623 96 14**

- odszkodowaniem za straty związane między innymi z karami wynikającymi z zawartych umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
11. Okres ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego dokumentu.
  12. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na realizację jakichkolwiek przebudów istniejącej sieci wodociągowej wynikających z konieczności usunięcia kolizji w terenie.
  13. Na terenie projektowanej inwestycji mogą znajdować się urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niebędące własnością Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.
  14. W przypadku występowania niewystarczającej głębokości położenia istniejącej sieci wodociągowej oraz innych utrudnień należy przewidzieć możliwość ich przełożenia. W takim przypadku należy wystąpić do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji.
  15. Uzgodnienie jest aktualne w stanie faktycznym i prawnym dla którego zostało wydane.
  16. Wykonywanie prac na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączach wodociagowych i kanalizacyjnych znajdujących się na majątku Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. bez uzgodnienia warunków technicznych usunięcia kolizji oraz zgłoszenia nadzoru nad prowadzonymi pracami jest naruszeniem własności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. i będzie zgłaszane organom ścigania.
  17. Na trzy miesiące przed rozpoczęciem robót prosimy o powiadomienie naszego przedsiębiorstwa o terminie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotową inwestycją.
  18. Uzgodnienie jest płatne zgodnie z wystawioną fakturą. Do uzgodnienia przyjęto 2 arkusze mapy w skali 1:500 formatu A4.

**PROKURENT**

*mgr Małgorzata Adamczyk*

**PROKURENT**

*mgr inż. Szymon Wyrwik*


Załącznik:

1 x Plan sytuacyjny.

Otrzymują: 1 x Adresat

1 x a/a



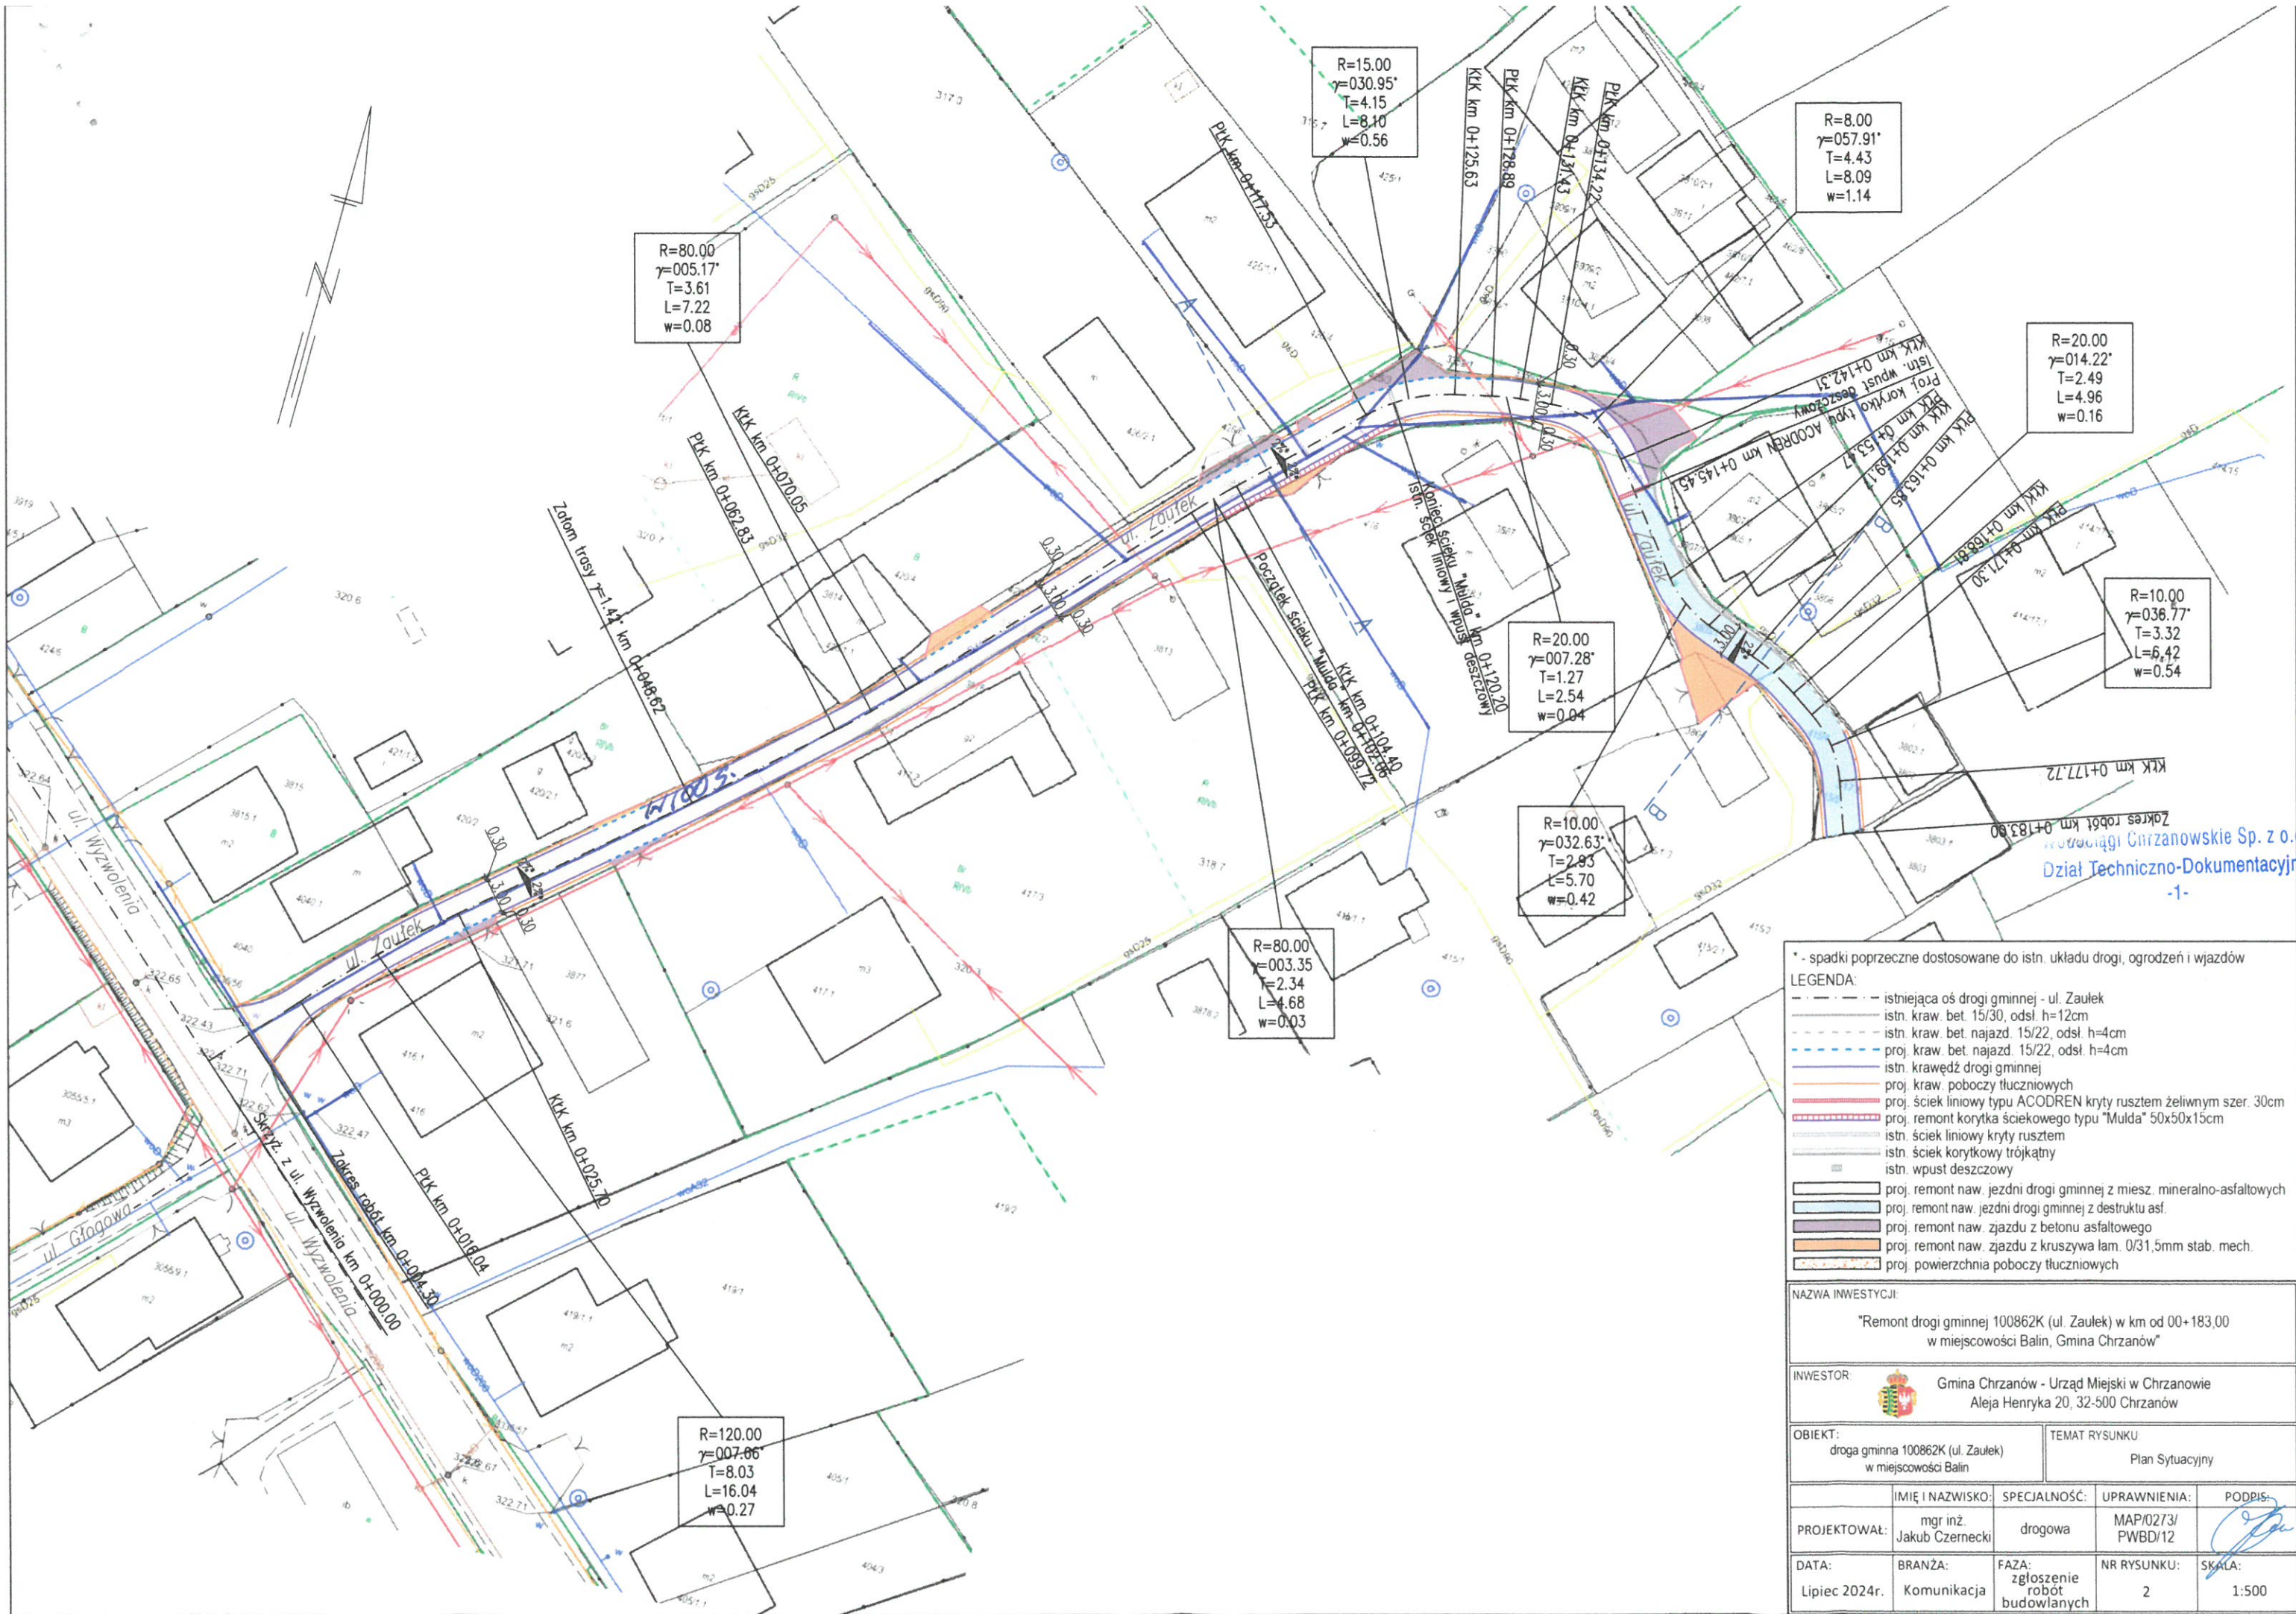

\* - spadki poprzeczne dostosowane do istn. układu drogi, ogrodzeń i wjazdów

**LEGENDA:**

- istniejąca oś drogi gminnej - ul. Zaulek
- istn. kraw. bet. 15/30, odsł. h=12cm
- istn. kraw. bet. najazd. 15/22, odsł. h=4cm
- proj. kraw. bet. najazd. 15/22, odsł. h=4cm
- istn. krawędź drogi gminnej
- proj. kraw. poboczy tłuczniowych
- proj. ściek liniowy typu ACODREN kryty rusztem żeliwnym szer. 30cm
- proj. remont korytka ściekowego typu "Mulda" 50x50x15cm
- istn. ściek liniowy kryty rusztem
- istn. ściek korytkowy trójkątny
- istn. wpust deszczowy
- proj. remont naw. jezdni drogi gminnej z miesz. mineralno-asfaltowych
- proj. remont naw. jezdni drogi gminnej z destruktu asf.
- proj. remont naw. zjazdu z betonu asfaltowego
- proj. remont naw. zjazdu z kruszywa łam. 0/31,5mm stab. mech.
- proj. powierzchnia poboczy tłuczniowych

**NAZWA INWESTYCJI:**

"Remont drogi gminnej 100862K (ul. Zaulek) w km od 00+183,00 w miejscowości Balin, Gmina Chrzanów"

**INWESTOR:**

Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie  
Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów

**OBIEKT:**

droga gminna 100862K (ul. Zaulek) w miejscowości Balin

**TEMAT RYSUNKU:**

Plan Sytuacyjny

IMIE I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Jakub Czernecki	drogowa	MAP/0273/ PWBD/12	

DATA:	BRANŻA:	FAZA:	NR RYSUNKU:	SKALA:
Lipiec 2024r.	Komunikacja	zgłoszenie robót budowlanych	2	1:500
